Retrospective: Sprint 1

📋 Resumen

Fecha	15 oct 2026
Equipo	Grupo 8 Capstone
Participantes	SEBASTIAN ENRIQUE FLORES ALVAREZ


💭 Retrospectiva

▶️ **Empezar a hacer**	🛑 **Dejar de hacer**	🙌 **Seguir haciendo**
Estimar los Puntos de Historia antes de iniciar el sprint. Como se observa en los charts, la estimación de tareas críticas (TS-01 y TS-02) se realizó el 30 de septiembre, el último día del sprint.	Alterar el alcance principal del sprint (Historias de Usuario o Requisitos No Funcionales completos) una vez que ya inició. Si bien es correcto desglosar el trabajo en subtareas técnicas diarias para ver el progreso, se debe evitar ingresar nuevos requerimientos pesados que alteren los Puntos de Historia totales planificados.	Completar las tareas fundamentales de arquitectura. A pesar de los cambios de alcance, se logró finalizar el Diseño de Arquitectura 4+1 (TS-01) y el Modelo de Datos SQL (TS-02).
Mantener el alcance del sprint fijo una vez iniciado. Se añadieron y eliminaron múltiples tareas de Rendimiento, Seguridad y Escalabilidad (RNF-01, RNF-02, RNF-04) durante el desarrollo, lo que dificultó el seguimiento del progreso.	Retrasar el cierre del sprint. El sprint finalizó formalmente el 15 de octubre, más de dos semanas después de su fecha planificada de término (30 de septiembre)	Utilizar las herramientas de seguimiento de Jira para identificar problemas en la planificación y ejecución de los sprints futuros.


✅ Elementos de acción

- Revisar y definir todas las Historias de Usuario y sus Puntos de Historia antes de iniciar el Sprint 2 (SEBASTIAN ENRIQUE FLORES ALVAREZ).
- Cerrar el sprint en la fecha de finalización planificada, independientemente de si todas las tareas están completadas (SEBASTIAN ENRIQUE FLORES ALVAREZ).

Burndown chart

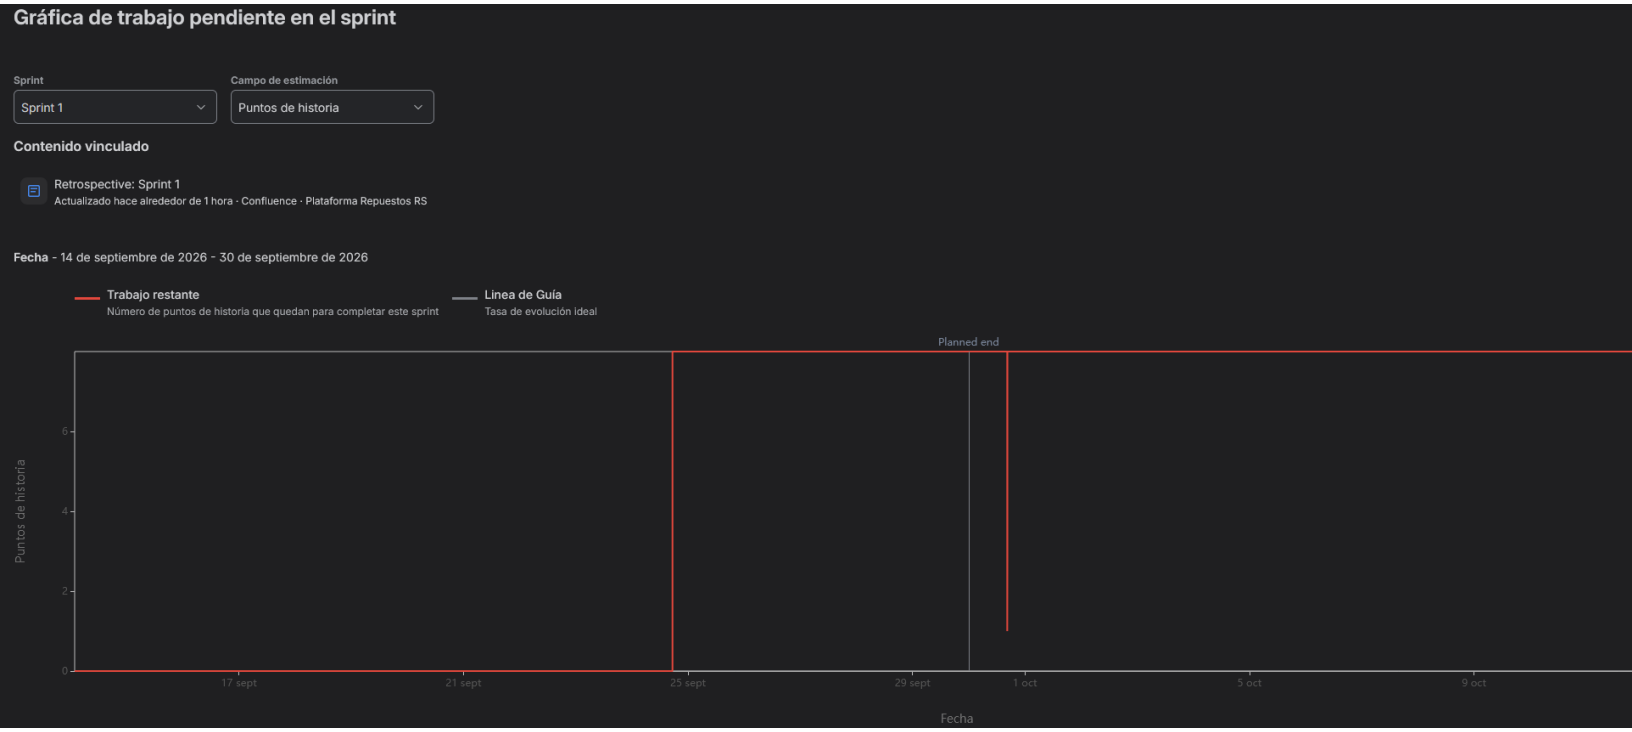

Informe: Sprint 1

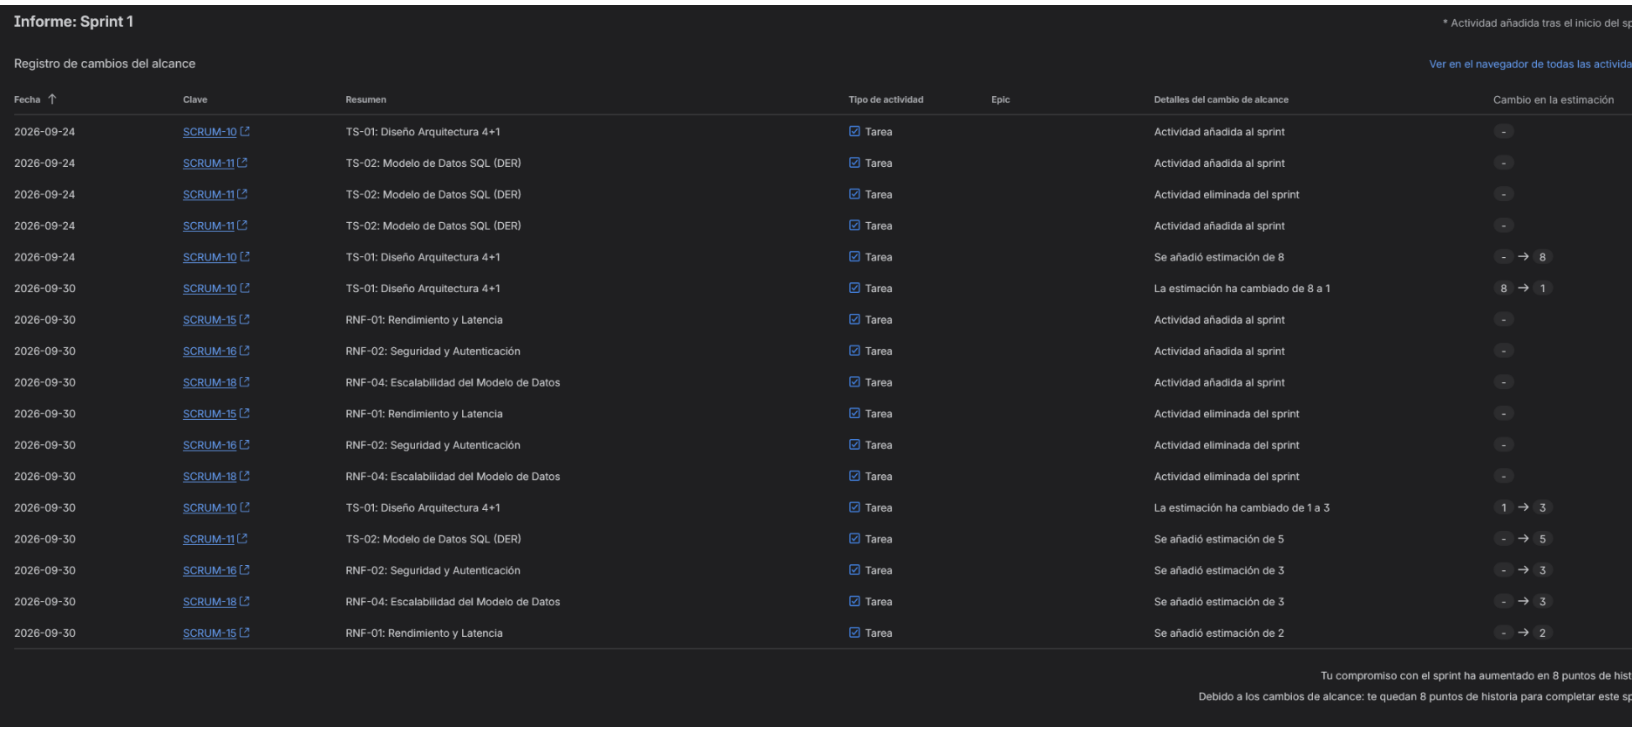

Informe: Sprint 1

* Actividad añadida tras el inicio del sp

Registro de cambios del alcance

Ver en el navegador de todas las activida

Fecha ↑	Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Detalles del cambio de alcance	Cambio en la estimación
2026-09-24	SCRUM-10	TS-01: Diseño Arquitectura 4+1	Tarea		Actividad añadida al sprint	-
2026-09-24	SCRUM-11	TS-02: Modelo de Datos SQL (DER)	Tarea		Actividad añadida al sprint	-
2026-09-24	SCRUM-11	TS-02: Modelo de Datos SQL (DER)	Tarea		Actividad eliminada del sprint	-
2026-09-24	SCRUM-11	TS-02: Modelo de Datos SQL (DER)	Tarea		Actividad añadida al sprint	-
2026-09-24	SCRUM-10	TS-01: Diseño Arquitectura 4+1	Tarea		Se añadió estimación de 8	- → 8
2026-09-30	SCRUM-10	TS-01: Diseño Arquitectura 4+1	Tarea		La estimación ha cambiado de 8 a 1	8 → 1
2026-09-30	SCRUM-15	RNF-01: Rendimiento y Latencia	Tarea		Actividad añadida al sprint	-
2026-09-30	SCRUM-16	RNF-02: Seguridad y Autenticación	Tarea		Actividad añadida al sprint	-
2026-09-30	SCRUM-18	RNF-04: Escalabilidad del Modelo de Datos	Tarea		Actividad añadida al sprint	-
2026-09-30	SCRUM-15	RNF-01: Rendimiento y Latencia	Tarea		Actividad eliminada del sprint	-
2026-09-30	SCRUM-16	RNF-02: Seguridad y Autenticación	Tarea		Actividad eliminada del sprint	-
2026-09-30	SCRUM-18	RNF-04: Escalabilidad del Modelo de Datos	Tarea		Actividad eliminada del sprint	-
2026-09-30	SCRUM-10	TS-01: Diseño Arquitectura 4+1	Tarea		La estimación ha cambiado de 1 a 3	1 → 3
2026-09-30	SCRUM-11	TS-02: Modelo de Datos SQL (DER)	Tarea		Se añadió estimación de 5	- → 5
2026-09-30	SCRUM-16	RNF-02: Seguridad y Autenticación	Tarea		Se añadió estimación de 3	- → 3
2026-09-30	SCRUM-18	RNF-04: Escalabilidad del Modelo de Datos	Tarea		Se añadió estimación de 3	- → 3
2026-09-30	SCRUM-15	RNF-01: Rendimiento y Latencia	Tarea		Se añadió estimación de 2	- → 2

Tu compromiso con el sprint ha aumentado en 8 puntos de hist

Debido a los cambios de alcance: te quedan 8 puntos de historia para completar este sp

Actividades incompletas

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia



Se han completado todas las actividades del sprint

Actividades completadas

Ver en el navegador de todas las actividades

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia
SCRUM-10	TS-01: Diseño Arquitectura 4+1	Tarea		Finalizada		3
SCRUM-11	TS-02: Modelo de Datos SQL (DER)	Tarea		Finalizada		5

Actividades completadas fuera del sprint

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia



No se ha completado ninguna actividad fuera del sprint
