Retrospective: Sprint 3


📋 Resumen

Fecha	5 nov 2026
Equipo	Grupo 8 Capstone
Participantes	SEBASTIAN ENRIQUE FLORES ALVAREZ


💭 Retrospectiva

▶️ **Empezar a hacer**	🛑 **Dejar de hacer**	🙌 **Seguir haciendo**
Planificar las tareas rezagadas desde el día uno. Las historias no completadas del sprint anterior (como HU-01 y HU-06) se añadieron el 19 de octubre, varios días después de iniciado el ciclo, lo que desvirtuó completamente la gráfica de trabajo.	Inflar el alcance a mitad del ciclo. El sprint comenzó con 19 puntos y se elevó drásticamente a 35 puntos de historia al sumar requerimientos técnicos e historias rezagadas, haciendo estadísticamente imposible cumplir la meta	Perseverar en la finalización de la deuda técnica. A pesar de los atrasos en las fechas, se logró cerrar definitivamente la HU-01 (Búsqueda por Patente y Número VIN) y la HU-06 (Panel de Administración) para el proyecto RepuestosRS.
Si una historia de usuario no se termina en un sprint, reestructurarla y reestimarla antes de meterla al siguiente, en lugar de simplemente trasladarla con su puntaje original.	Extender las fechas de cierre de forma manual. El sprint estaba planificado para terminar el 30 de octubre, pero se cerró forzadamente el 5 de noviembre, perdiendo la cadencia de tiempo fijo que exige Scrum.	Transparentar las métricas de fracaso en la planificación. Dejar registro de las 6 actividades incompletas (25 puntos totales) demuestra un uso honesto de la herramienta Jira, fundamental para mejorar la estimación futura.

Burndown Chart

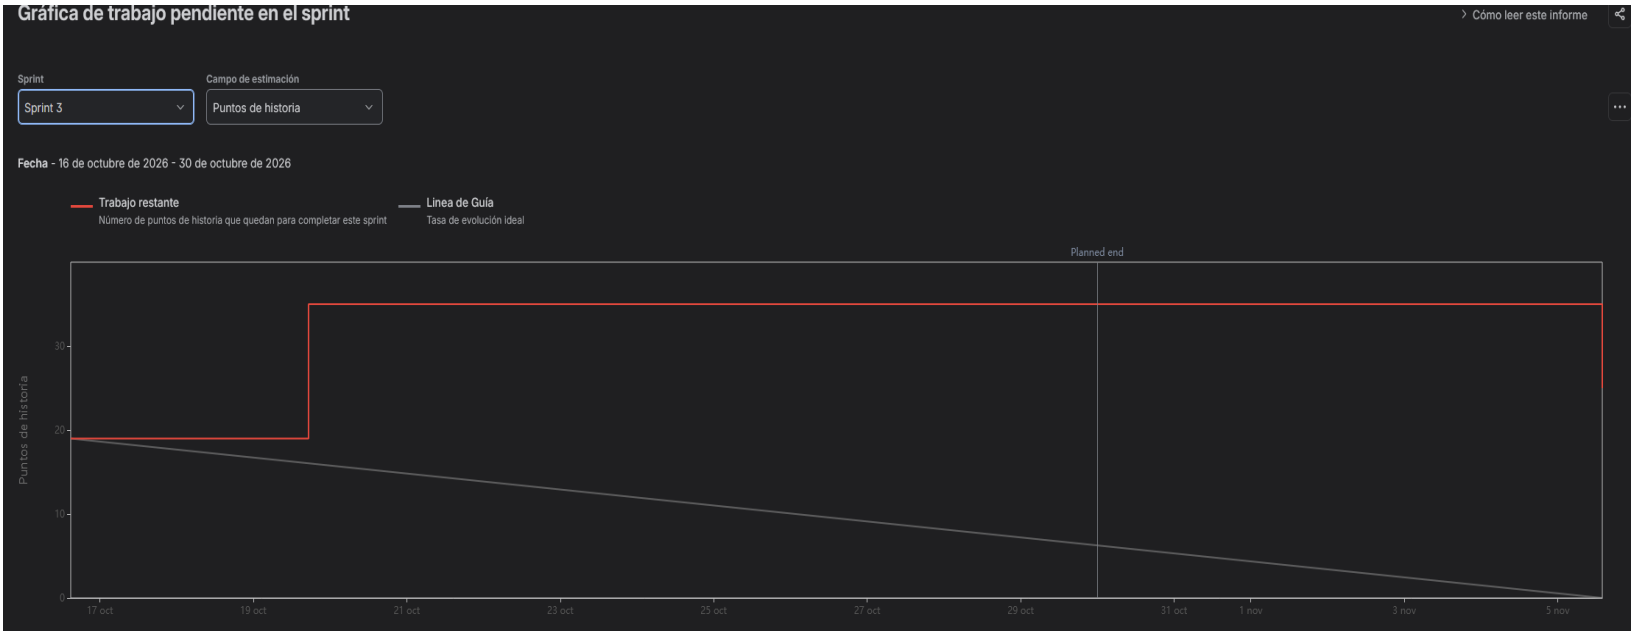

Informe: Sprint 3

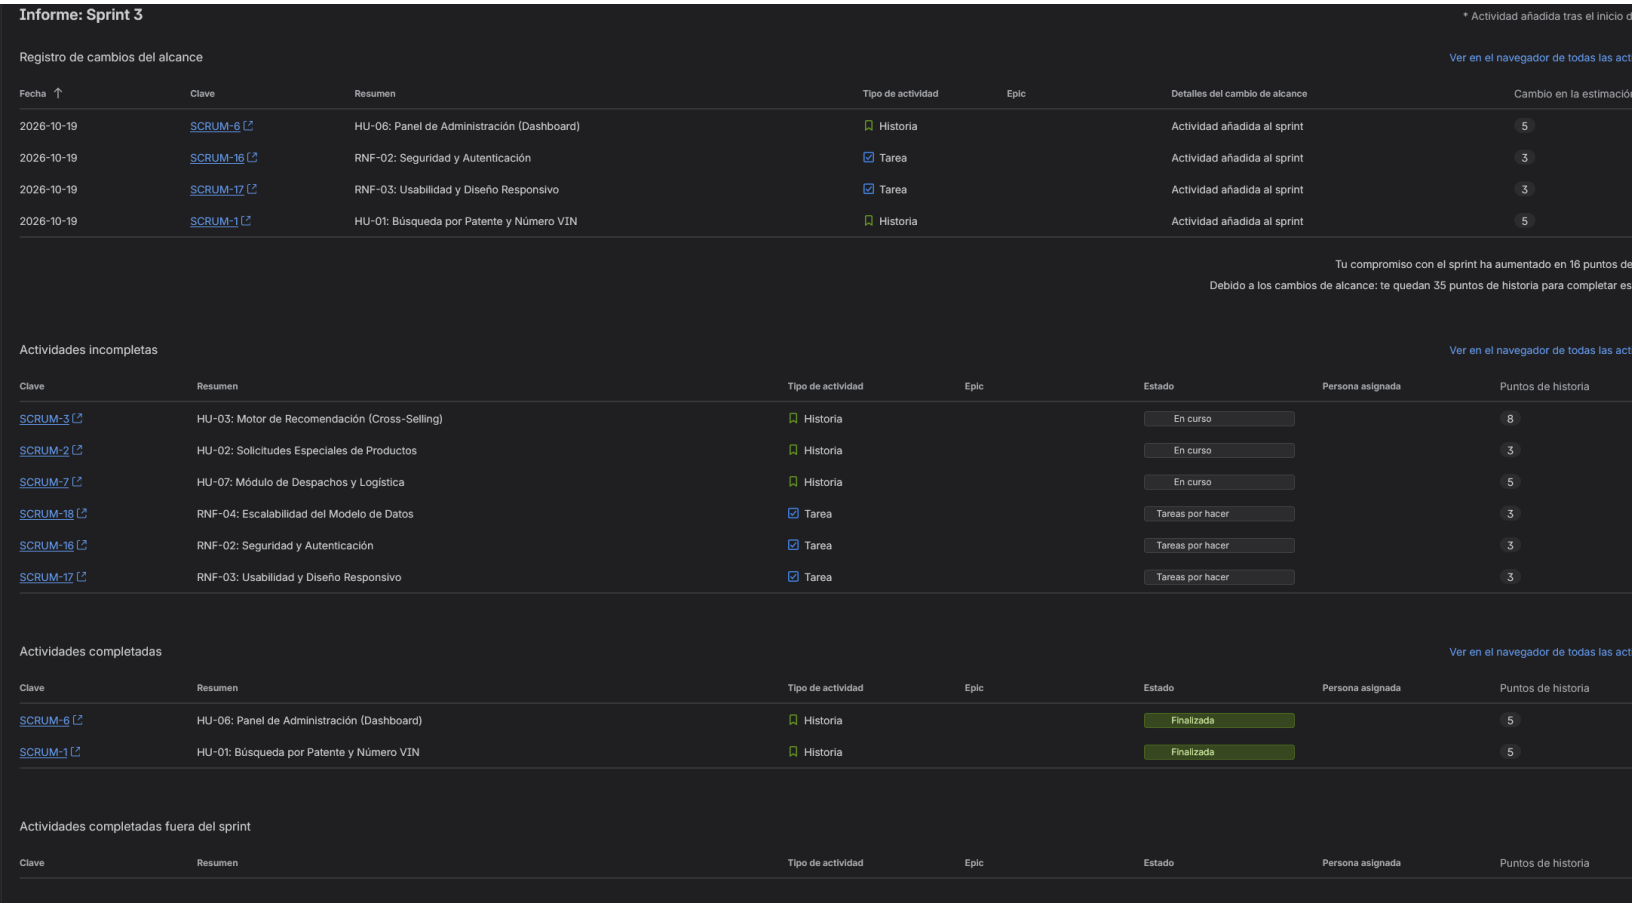

Informe: Sprint 3

* Actividad añadida tras el inicio d

Registro de cambios del alcance

Ver en el navegador de todas las act

Fecha	Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Detalles del cambio de alcance	Cambio en la estimació
2026-10-19	SCRUM-6	HU-06: Panel de Administración (Dashboard)	Historia		Actividad añadida al sprint	5
2026-10-19	SCRUM-16	RNF-02: Seguridad y Autenticación	Tarea		Actividad añadida al sprint	3
2026-10-19	SCRUM-17	RNF-03: Usabilidad y Diseño Responsivo	Tarea		Actividad añadida al sprint	3
2026-10-19	SCRUM-1	HU-01: Búsqueda por Patente y Número VIN	Historia		Actividad añadida al sprint	5

Tu compromiso con el sprint ha aumentado en 16 puntos de

Debido a los cambios de alcance: te quedan 35 puntos de historia para completar es

Actividades incompletas

Ver en el navegador de todas las act

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia
SCRUM-3	HU-03: Motor de Recomendación (Cross-Selling)	Historia		En curso		8
SCRUM-2	HU-02: Solicitudes Especiales de Productos	Historia		En curso		3
SCRUM-7	HU-07: Módulo de Despachos y Logística	Historia		En curso		5
SCRUM-18	RNF-04: Escalabilidad del Modelo de Datos	Tarea		Tareas por hacer		3
SCRUM-16	RNF-02: Seguridad y Autenticación	Tarea		Tareas por hacer		3
SCRUM-17	RNF-03: Usabilidad y Diseño Responsivo	Tarea		Tareas por hacer		3

Actividades completadas

Ver en el navegador de todas las act

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia
SCRUM-6	HU-06: Panel de Administración (Dashboard)	Historia		Finalizada		5
SCRUM-1	HU-01: Búsqueda por Patente y Número VIN	Historia		Finalizada		5

Actividades completadas fuera del sprint

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia
